

EN-TÊTE OFFICIEL — IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

African Trade and Industry Company **ATRIC SARL**

African Industrial & Business Solutions

 Société à Responsabilité Limitée au capital de **990 000 FCFA**

 Yaoundé – Cameroun

 Tél. : **+237 620 71 90 40**

 **contact@atricsarl.com**

 **www.atricsarl.com**

RCCM : RC/YAO/2026/M/344

DOCUMENT JOINT

**Business Plan de Déploiement — Plan d'action de mise en
œuvre sur 12 mois**



Plan d'action de mise en œuvre sur 12 mois

De la plateforme prête (fin Phase 1) au pilote validé dans 50 établissements de Yaoundé et Douala : stratégie de mise en œuvre, feuille de route mensuelle, organisation, partenariats et gestion des risques du déploiement opérationnel de Kamili EduCampus.

12 mois

HORIZON DU PLAN

50 écoles

CIBLE PILOTE

≈60k

ÉLÈVES COUVERTS

30 M

FCFA MOBILISÉS

Comment lire ce business plan

Ce document est le pendant opérationnel du **Dossier Budgétaire d'Investissement** (50 M FCFA / 18 mois) et de la **Documentation Technique** déjà produits par ATRIC SARL. Là où le dossier budgétaire finance la transformation de la maquette en plateforme de production (Phase 1, mois 1–6), ce business plan détaille **le plan d'action concret de mise en œuvre de la solution sur le terrain** : les 12 mois de déploiement à proprement parler (Phases 2 et 3 du programme global, mois 7 à 18), une fois la plateforme technique prête.

Pourquoi 12 mois exactement. Dans le chronogramme déjà budgété, la « Phase 2 — Déploiement pilote » (mois 7–12, 18 M FCFA) et la « Phase 3 — Industrialisation & extension » (mois 13–18, 12 M FCFA) couvrent ensemble **12 mois consécutifs et 30 M FCFA**. C'est cette période — celle où l'application quitte le statut de prototype pour être réellement utilisée par des élèves, parents, enseignants et directions d'école — que ce document développe en plan d'action mensuel.

Ce que ce document ajoute

Déjà couvert ailleurs :

- Le budget poste par poste et le calendrier de décaissement (Dossier Budgétaire)
- L'architecture logicielle et la feuille de route technique (Documentation Technique)

Objet de ce document :

- Le contexte de marché chiffré et sourcé (démographie, mobile money, cadre légal, concurrence)
- La stratégie de mise en œuvre : sélection des écoles, onboarding, formation, support
- La feuille de route mois par mois, l'organisation de l'équipe terrain, les partenariats et les risques

Toutes les données de marché citées dans ce document proviennent de sources publiques identifiées (organismes officiels, presse spécialisée, cabinets d'études). La liste complète figure en dernière page. Les chiffres marqués « cible » ou « proposition » sont des objectifs internes formulés pour ce plan et non des données de marché.

Du prototype à la preuve de traction

Kamili EduCampus est une plateforme numérique multi-acteurs (parents, élèves, enseignants, directions d'établissement, ministères) conçue par ATRIC SARL pour digitaliser le suivi scolaire et la collecte d'une micro-cotisation nationale de **2 000 FCFA par élève et par an** ($\approx 5,5$ FCFA/jour) au Cameroun. Le produit existe aujourd'hui sous forme de maquette fonctionnelle avancée (86 écrans, 8 espaces utilisateurs). Une fois la plateforme de production livrée (Phase 1), l'enjeu des 12 mois suivants n'est plus technique mais opérationnel : **faire adopter l'outil par 50 établissements réels** et transformer cette adoption en argument de négociation institutionnelle.

30 M FCFA

BUDGET DÉPLOIEMENT (12 MOIS)

Source : Dossier budgétaire, Phases 2+3

50

ÉTABLISSEMENTS PILOTES

Yaoundé (Centre) & Douala (Littoral)

$\approx 60\,000$

ÉLÈVES COUVERTS

Source : Dossier budgétaire

6 M FCFA

REVENU PLATEFORME VISÉ /AN

Hypothèse 5 % sur flux collecté

Ce que ce plan cherche à démontrer en 12 mois

1. **La preuve d'usage** — 50 établissements réellement actifs, pas seulement inscrits (paiements traités, notes saisies, présence suivie).
2. **La preuve de collecte** — un flux réel de micro-cotisation transitant par la plateforme via Orange Money et MTN MoMo.
3. **La preuve institutionnelle** — un dossier de conventionnement déposé et négocié avec au moins un ministère de tutelle, condition d'accès au marché national.

Point de vigilance stratégique. ATRIC SARL perçoit une commission de gestion de 5 % sur les flux de la micro-cotisation traités — non pas des frais de paiement au sens strict, mais la rémunération d'un service de gestion d'un fonds national (collecte, réconciliation, reporting aux ministères, réinvestissement fléché vers enseignants et infrastructures). Le risque : un observateur externe pourrait comparer naïvement ce taux aux frais marchands standards d'Orange Money et MTN MoMo (**0,5 % à 1,5 %** du montant transigé), nettement plus bas. Il faudra donc documenter explicitement, dès le pilote, ce que ces 5 % financent au-delà du simple encaissement — c'est un axe de négociation à préparer en amont, pas à la fin. Voir la section « Analyse des risques ».

Un marché scolaire vaste, une infrastructure de paiement mature

Trois conditions de marché rendent le déploiement de Kamili EduCampus plausible aujourd'hui : un système éducatif de grande taille, une pénétration du mobile money parmi les plus fortes d'Afrique francophone, et un cadre légal sur les données personnelles désormais posé.

Démographie & éducation




Chiffres du secteur public repris du dossier d'investissement « Kamili EduCampus — Déploiement National & Impact Macro-Économique » (ATRIC SARL, août 2026) : MINEDUB (base) 3 200 000 élèves / 21 730 établissements / 104 000 enseignants ; MINESEC (secondaire) 1 850 000 / 6 830 / 62 000 ; MINESUP (supérieur) 435 000 / 246 / 11 800. Ce sont des ordres de grandeur calibrés sur les statistiques publiques du secteur, à consolider avec les données officielles des ministères lors du déploiement — le secteur privé (non compris ici) s'y ajoute.

Taille du marché adressable — logique TAM / SAM / SOM



Barres à échelle indicative — objectif : situer le pilote (50 établissements, ≈0,17 % des établissements publics du pays) comme une première étape volontairement restreinte et gérable, avant l'extension régionale (Phase 2, ≈1 M d'élèves) puis nationale (Phase 3, ≈6 M d'élèves — voir « Trajectoire post-pilote »).

Mobile money — l'infrastructure de collecte est déjà là



Connectivité — suffisante en zone urbaine, à surveiller ailleurs

41,9 %

TAUX DE PÉNÉTRATION
INTERNET

*DataReportal, Digital 2026
Cameroon*

12,6 M

INTERNAUTES (FIN 2025)

DataReportal / Kepios

29,0 M

CONNEXIONS MOBILES
ACTIVES

DataReportal, fin 2025

≈75 %

POPULATION COUVERTE
3G/4G

ITU, via Business in Cameroon

Lecture pour le déploiement : le Cameroun reste sous la moyenne africaine en haut débit mobile (≈30 abonnements pour 100 habitants, contre ≈52 en moyenne continentale). C'est une raison supplémentaire de démarrer le pilote à Yaoundé et Douala — les deux zones les mieux couvertes — plutôt qu'en zone rurale, et de prévoir des parcours utilisateurs tolérants aux coupures réseau.

Cadre légal — une fenêtre de mise en conformité

La **loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024** relative à la protection des données à caractère personnel a été promulguée par la Présidence de la République et devient pleinement applicable aux entreprises opérant au Cameroun à partir de **juin 2026** — soit pendant la fenêtre même de ce plan de déploiement. Elle renforce la loi n° 2010/012 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Pour Kamili EduCampus, qui traite des données scolaires et financières de mineurs, la mise en conformité (consentement, hébergement souverain, désignation d'un référent protection des données) n'est pas une option différée mais un prérequis du pilote — déjà anticipé dans la ligne budgétaire « Sécurité, conformité & protection des données » du dossier d'investissement.

Marché edtech africain — un vent favorable

Le marché africain des technologies éducatives est évalué à **7,33 Md USD en 2025** et projeté à **19,25 Md USD en 2034** (croissance annuelle moyenne de 11,3 %), porté par l'expansion de la connectivité mobile et les initiatives publiques de digitalisation de l'éducation (source : IMARC Group). Ce n'est pas un chiffre camerounais, mais il situe le pilote dans une dynamique régionale réelle plutôt qu'un pari isolé.

Le terrain n'est pas vierge — et c'est une information utile

Plusieurs logiciels de gestion scolaire sont déjà commercialisés au Cameroun, certains avec paiement Mobile Money intégré. Le déploiement doit donc se positionner explicitement face à eux plutôt que supposer un marché sans alternative.

Acteur	Positionnement observé	Ce que Kamili EduCampus fait différemment
EduCam Pro	Se présente comme le logiciel de gestion scolaire n°1 au Cameroun ; inscriptions, notes, bulletins sécurisés, paiement MTN MoMo / Orange Money, notification SMS aux parents.	Kamili couvre en plus la supervision ministérielle (MINEDUB/MINESEC/MINESUP) et l'enseignement supérieur dans un même espace — pas seulement l'école et la famille.
Akademise School	Revendique plus de 120 établissements clients ; notes, bulletins, emplois du temps, paiement Mobile Money.	Modèle de commission sur flux plutôt qu'abonnement SaaS par école — aligne le revenu de Kamili sur l'usage réel plutôt que sur la vente initiale.
Wacni	Logiciel bilingue FR/EN présent au Cameroun, en Afrique francophone et à l'international.	Ambition explicite de conventionnement d'État et d'extension nationale coordonnée, pas une expansion école par école.
EcoTech Solutions	Offre d'entrée de gamme gratuite pour inscriptions, bulletins et suivi des frais scolaires.	Architecture multi-tenant pensée dès la maquette pour absorber des milliers d'établissements sans refonte (voir Documentation Technique).
Studirium	Start-up fondée en 2024, approche par l'IA pour l'organisation de la vie scolaire, Afrique et Europe.	Ancrage local fort (données calibrées sur le système éducatif camerounais réel) et relation institutionnelle directe avec les ministères.

Conséquence pour le déploiement : les équipes terrain doivent être formées à argumenter face à des directions d'établissement qui auront probablement déjà été démarchées par un concurrent. L'argument différenciant à mettre en avant n'est pas la fonctionnalité (comparable) mais la trajectoire — reconnaissance d'État visée, gratuité potentielle pour l'école grâce au modèle de commission, et intégration verticale jusqu'au ministère.

OBJECTIFS DE LA PÉRIODE

Ce que « réussi » veut dire au mois 12

Indicateur	Cible mois 12	Nature du chiffre
Établissements actifs	50	Repris du dossier budgétaire — jalon de sortie Phase 2
Élèves couverts	≈ 60 000	Repris du dossier budgétaire
Flux annuel de cotisations traité	120 M FCFA	Repris du dossier budgétaire (hypothèse de modélisation)
Revenu plateforme (commission)	6 M FCFA	Calculé à 5 % du flux ci-dessus — taux à négocier
Délai moyen d'onboarding par établissement	≤ 2 semaines	Cible opérationnelle interne (proposée dans ce plan)
Taux d'établissements « actifs » vs simplement « inscrits »	≥ 80 %	Cible opérationnelle interne (proposée dans ce plan)
Dossier de conventionnement déposé	1 ministère min.	Repris du dossier budgétaire — jalon de sortie Phase 3

« Actif » doit être défini opérationnellement dès le mois 1 : par exemple, un établissement ayant saisi des notes ou traité au moins un paiement dans les 30 derniers jours. Cette définition conditionne la crédibilité de tous les chiffres présentés au dossier ministériel en fin de période.

Du contrat signé à l'usage quotidien


Le déploiement suit un parcours en 6 étapes, répété par vague d'établissements plutôt que tenté sur les 50 écoles simultanément — ce qui permettrait d'ajuster le processus après les premiers retours.

Sélection des établissements pilotes

Critères proposés, par ordre de priorité :

- **Connectivité suffisante** — zone urbaine Yaoundé (Centre) ou Douala (Littoral), couverture 3G/4G confirmée.
- **Direction motrice** — direction d'établissement volontaire, capable de porter le changement auprès des enseignants.
- **Mixité public/privé** — pour tester le produit dans des contextes de gouvernance différents et alimenter un dossier ministériel crédible sur les deux secteurs.
- **Taille représentative** — éviter de concentrer le pilote sur de très grands établissements non représentatifs de la moyenne nationale.

Processus d'onboarding par établissement (parcours type)

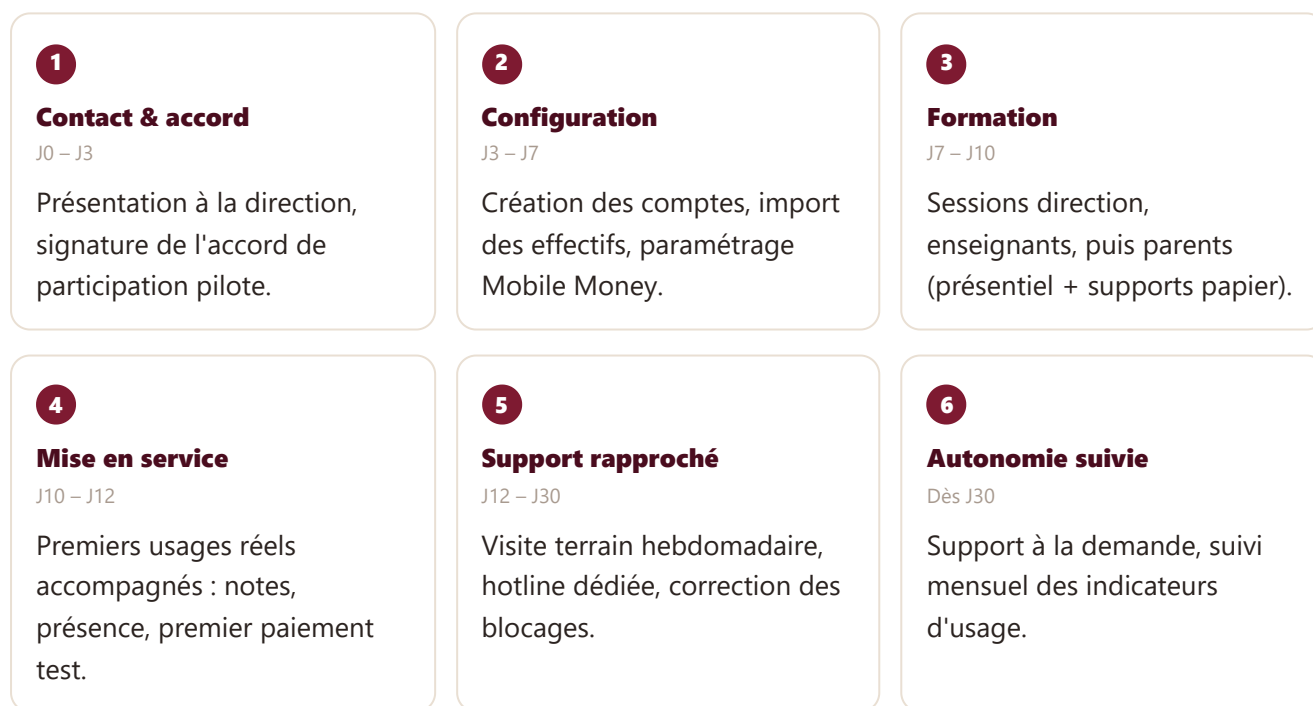

Formation — trois publics, trois formats

Public	Contenu	Format
Direction & personnel administratif	Pilotage, finances, inscriptions, permissions, rapports	Session en présentiel, 1 journée, sur site

Public	Contenu	Format
Enseignants	Saisie des notes, cahier de texte, présence, messagerie parents	Atelier pratique en présentiel, 2-3 heures
Parents	Suivi de l'enfant, paiement de la cotisation via Mobile Money, notifications	Séance communautaire courte + guide illustré papier (faible dépendance à la littératie numérique)

Support terrain

Une hotline dédiée (voix + WhatsApp, canal déjà largement utilisé au Cameroun) et deux agents de terrain itinérants (un par ville pilote) assurent la résolution des blocages dans les 72 premières heures suivant chaque mise en service — la fenêtre critique où un mauvais départ peut compromettre l'adoption durable.

Plan d'action mois par mois

Les 12 mois se lisent dans la continuité du chronogramme du dossier budgétaire : les 6 premiers mois correspondent à la Phase 2 (« Déploiement pilote »), les 6 suivants à la Phase 3 (« Industrialisation & extension »).

Mois	Prog.	Objectif du mois	Actions clés	Jalon
1	M7	Lancement opérationnel	Recrutement de l'équipe terrain (Yaoundé/Douala) ; sélection finale des 50 établissements ; premiers accords signés	Équipe & liste des 50 écoles validées
2	M8	1 ^{re} vague d'onboarding	Configuration de 15 établissements ; formation direction + enseignants ; test Mobile Money en conditions réelles	15 établissements formés
3	M9	Montée en puissance	Onboarding de 15 établissements supplémentaires (total 30) ; première collecte réelle de cotisations	30 actifs, 1 ^{re} cotisation collectée
4	M10	Généralisation du pilote	Onboarding des 20 établissements restants (total 50) ; formation des parents ; ajustements produit	50 établissements onboardés
5	M11	Consolidation & adoption	Campagne d'adoption parents (SMS, ambassadeurs) ; support terrain renforcé ; suivi des taux d'usage	Taux d'usage suivi par école
6	M12	Bilan à 6 mois	Audit des 50 établissements (usage, paiements, satisfaction) ; rapport intermédiaire	50 établissements actifs (jalon Phase 2)
7	M13	Stabilisation technique	Corrections à partir des données réelles ; montée en charge infrastructure ; renforcement conformité (loi 2024/017)	Plateforme stabilisée en charge réelle
8	M14	Ouverture institutionnelle	Dépôt du dossier de conventionnement (MINEDUB/MINESEC/MINESUP) ; premières réunions de négociation	Dossier déposé
9	M15	Négociation & structuration	Poursuite des négociations (taux de commission, cadre juridique) ; comité de pilotage public-privé proposé	Position de négociation stabilisée
10	M16	Dossier national	Business case régional (10 régions) à partir des données du pilote ; identification de partenaires/bailleurs	Dossier d'extension rédigé
11	M17	Valorisation & communication	Rapport d'impact du pilote ; communication presse ; événement de restitution avec écoles et partenaires	Rapport d'impact publié

Mois	Prog.	Objectif du mois	Actions clés	Jalon
12	M18	Clôture & bascule Année 2	Convention-cadre visée avec au moins un ministère ; dossier national finalisé ; plan Année 2 présenté	Convention-cadre & dossier national (jalón Phase 3)

Mois « Prog. » = numérotation dans le chronogramme global à 18 mois du dossier budgétaire (Phase 1 : mois 1-6, non couverte par ce document). Le rythme d'onboarding (15/15/20 établissements) est une proposition à ajuster selon la disponibilité réelle de l'équipe terrain constituée au mois 1.

Une équipe de déploiement resserrée

Proposition d'organisation pour porter les 12 mois de déploiement, distincte de l'équipe produit/technique déjà prévue dans le dossier budgétaire (poste « Ressources humaines », 13 M FCFA / 18 mois).

Chef-fe de projet Déploiement

Pilotage global, reporting vers la direction ATRIC, arbitrages calendaires.

Responsable Formation & Pédagogie

Conception des supports, animation des sessions direction/enseignants.

Agent de terrain — Yaoundé

Onboarding, formation parents, support rapproché sur site.

Agent de terrain — Douala

Onboarding, formation parents, support rapproché sur site.

Responsable Relations Institutionnelles

Interface avec MINEDUB / MINESEC / MINESUP, montage du dossier de conventionnement.

Responsable Support Client

Hotline voix/WhatsApp, ticketing, remontée des blocages produit.

Chargé-e Marketing & Communication

Positionnement face à la concurrence, contenus, relations presse, événement de restitution.

Référent Sécurité & Conformité

Mise en conformité loi n° 2024/017, interface avec l'équipe technique sur l'hébergement souverain.

Organisation proposée dans le cadre de ce plan — à confronter à l'enveloppe RH réelle disponible dans le budget des Phases 2 et 3.

Trois cercles de partenaires à activer

Opérateurs Mobile Money

Orange Money et MTN MoMo sont déjà les rails de paiement prévus par la Documentation Technique. Au-delà de l'intégration technique (Phase 1), le déploiement doit négocier : un barème de frais marchands adapté au volume attendu (référence marché : 0,5-1,5 %), et l'usage des réseaux de points de vente physiques (100 000+ pour Orange, 168 000+ pour MTN) comme relais pour les parents peu à l'aise avec le paiement applicatif.

Ministères de tutelle

MINEDUB (enseignement de base), MINESEC (secondaire) et MINESUP (supérieur) sont les interlocuteurs du dossier de conventionnement. L'espace ministériel déjà modélisé dans la maquette (supervision, résultats, alertes par région) constitue un argument démonstratif concret à présenter dès le dépôt du dossier — plutôt qu'une simple promesse.

Synergies institutionnelles à explorer

La Banque Mondiale finance déjà un programme de financement basé sur les résultats (FBP) couvrant plus de 5 200 écoles primaires publiques camerounaises (année scolaire 2024-2025). Sans qu'un lien direct existe à ce stade, ce type de programme illustre l'existence de financements et de cadres de coopération actifs dans le secteur, à investiguer comme piste de cofinancement ou de caution institutionnelle pour l'extension post-pilote.

BUDGET DE LA PÉRIODE

30 M FCFA pour porter le pilote à maturité

Le budget de cette période de 12 mois est celui déjà arrêté dans le dossier budgétaire pour les Phases 2 et 3 — ce plan ne modifie pas les montants, il détaille comment ils sont déployés sur le terrain.

2

Déploiement pilote
Mois 7 – 12 (6 mois)
18 M FCFA
Jalon : 50 établissements actifs

3

Industrialisation & extension
Mois 13 – 18 (6 mois)
12 M FCFA
Jalon : convention-cadre & dossier national

Rythme de décaissement (trimestriel)



Source : Dossier Budgétaire d'Investissement, calendrier de décaissement — total 30 M FCFA sur les 4 derniers trimestres du programme.

Ligne directement liée à l'exécution terrain

Dans la répartition par poste de dépense du programme global (50 M FCFA / 18 mois), la ligne « **Déploiement pilote — formation, équipement, support terrain** » représente **10 M FCFA (20 %)** et finance directement les activités décrites dans ce document (formation, déplacements des agents terrain, supports pédagogiques, hotline). Le solde des 30 M FCFA de cette période couvre la part proportionnelle des autres postes actifs pendant ces 12 mois : stabilisation technique, salaires de l'équipe produit, infrastructure cloud, sécurité/conformité, relations institutionnelles et juridique.

Ce qui peut faire échouer le pilote — et comment le prévenir

Risque	Niveau	Description	Mitigation
Perception de la commission	Élevé	La commission de gestion (5 %) est plus élevée que les frais marchands mobile money standards (0,5-1,5 %) — risque de comparaison naïve malgré une nature différente (gestion d'un fonds national vs simple paiement).	Documenter et communiquer explicitement ce que les 5 % financent (reporting, supervision, réinvestissement) dès le pilote ; préparer des scénarios de taux dégressif avec les ministères.
Adoption & littératie numérique	Moyen	Résistance au changement chez les enseignants et parents peu familiers du numérique.	Formation en présentiel, supports papier illustrés, ambassadeurs pairs dans chaque établissement.
Connectivité variable	Moyen	Haut débit mobile sous la moyenne africaine ($\approx 30/100$ hab.) malgré une bonne couverture 3G/4G urbaine.	Pilote concentré en zone urbaine bien couverte ; parcours tolérants aux coupures réseau.
Conformité réglementaire	Moyen	Entrée en application de la loi n° 2024/017 sur les données personnelles dès juin 2026, en plein pilote.	Mise en conformité anticipée (déjà budgétée), référent conformité dédié, hébergement souverain.
Concurrence installée	Moyen	Plusieurs solutions concurrentes (EduCam Pro, Akademise, Wacni, EcoTech) déjà en place avec paiement Mobile Money.	Argumentaire différenciant centré sur la reconnaissance d'État et la couverture ministérielle, pas la fonctionnalité seule.
Lenteur institutionnelle	Faible-Moyen	Le dossier de conventionnement dépend de délais administratifs hors du contrôle direct d'ATRIC.	Engager le dialogue institutionnel dès le mois 1 (pas d'attente de la fin du pilote pour prendre contact).

Le pilote comme preuve, pas comme finalité

La valeur des 30 M FCFA investis dans ce déploiement ne se mesure pas seulement aux 50 établissements couverts, mais à la trajectoire qu'ils permettent de démontrer.

Phase	Élèves couverts	Flux annuel collecté	Revenu plateforme (5 %)
Pilote (ce plan, mois 1-12)	60 000	120 000 000 FCFA	6 000 000 FCFA
Régionale (10 régions)	1 000 000	2 000 000 000 FCFA	100 000 000 FCFA
Nationale (saturation)	6 000 000	12 000 000 000 FCFA	600 000 000 FCFA

Chiffres repris du Dossier Budgétaire d'Investissement — hypothèse de modélisation à 5 % de commission, taux définitif soumis à négociation avec les ministères de tutelle (voir « Analyse des risques »). Ils n'engagent pas ATRIC SARL au-delà de leur valeur illustrative.

Ce que « réussir » l'année de déploiement change concrètement : un pilote de 50 écoles avec adoption réelle, collecte effective et dossier ministériel déposé transforme Kamili EduCampus d'un prototype financé par capital d'amorçage en plateforme dont l'extension nationale peut être négociée sur la base de résultats vérifiables — plutôt que de projections.

Sources

Données de marché collectées en août 2026. Les chiffres d'établissements scolaires datent des derniers annuaires publics accessibles et devraient être recroisés avec les données les plus récentes du MINEDUB / MINESEC avant la sélection définitive des écoles pilotes.

Institut National de la Statistique du Cameroun (INS) — Chiffres et indicateurs clés de l'éducation et de la formation au Cameroun, 2023 — ins-cameroun.cm

MINESEC — Annuaire Statistique 2023-2024 — minesec.gov.cm

Wikipédia FR — Système éducatif au Cameroun (effectifs 2018, budget éducation 3,15 % du PIB) — fr.wikipedia.org/wiki/Système_éducatif_au_Cameroun

Actu Cameroun — Rentrée scolaire 2023-2024 : plus de 8 millions d'élèves — actucameroun.com

Worldometer — Cameroon Population 2026 — worldometers.info/world-population/cameroon-population

Investir au Cameroun — Orange Money : plus de 11,5 % des clients africains, mai 2025 — investiraucameroun.com

Presse spécialisée (Kamer Android, Infos Pratiques CM) — Statistiques MTN Mobile Money Cameroun 2025-2026 — [kamer-android.com / infospratiques.cm](https://kamer-android.com/infospratiques.cm)

GSMA — State of the Industry Report on Mobile Money 2025 — gsma.com/sotir

DataReportal / Kepios — Digital 2026: Cameroon — datareportal.com/reports/digital-2026-cameroon

ITU (via Business in Cameroon) — 75 % de la population camerounaise couverte en 3G/4G — businessincameroon.com

Présidence de la République du Cameroun — Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel — prc.cm

CIO Mag — Analyse de la loi du 23 décembre 2024 et échéance de conformité juin 2026 — cio-mag.com

IMARC Group — Africa Edtech Market Size, Share, Trends and Forecast 2026-2034 — imarcgroup.com/africa-edtech-market

World Bank — Document de projet (programme FBP, 5 200 écoles primaires publiques, 2024-2025) — documents1.worldbank.org

Sites de solutions concurrentes — EduCam Pro, Akademise School, Wacni, EcoTech Solutions, Studirium (positionnements autodéclarés sur leurs sites officiels)

ATRIC SARL — Kamili EduCampus, Dossier Budgétaire d'Investissement (Août 2026), Documentation Technique v1.0 (Août 2026) et Dossier d'Investissement « Déploiement National & Impact Macro-Économique » (Août 2026) — documents internes ; chiffres du secteur public (élèves, établissements, enseignants par ministère) et paramètres du modèle de micro-cotisation issus de ce dernier document

Kamili EduCampus — Business Plan de Déploiement — ATRIC SARL — Août 2026 — Document de travail
