

EN-TÊTE OFFICIEL — IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ

African Trade and Industry Company **ATRIC SARL**

African Industrial & Business Solutions



Société à Responsabilité Limitée au capital de **990 000 FCFA**



Yaoundé – Cameroun



Tél. : **+237 620 71 90 40**



contact@atricsarl.com



www.atricsarl.com

RCCM : RC/YAO/2026/M/344

DOCUMENT JOINT

**Dossier Budgétaire d'Investissement — 50 000 000 FCFA sur
18 mois**



DOSSIER BUDGÉTAIRE D'INVESTISSEMENT

50 000 000 FCFA sur 18 mois

Du prototype fonctionnel au pilote national : plan de financement détaillé pour transformer la maquette Kamili EduCampus en plateforme de production et déployer les 50 premiers établissements.

18 mois

DURÉE DU PROGRAMME

3 phases

CHRONOGRAMME

50 écoles

PILOTE DE DÉPLOIEMENT

8 postes

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

Un investissement d'amorçage, un objectif mesurable

Ce budget finance la transition entre la maquette actuelle de Kamili EduCampus — un prototype fonctionnel de 86 écrans couvrant 8 espaces utilisateurs — et une plateforme de production opérant un pilote réel dans 50 établissements des villes de Yaoundé et Douala. Il ne couvre pas le déploiement national complet, dont le financement proviendra du flux de la micro-cotisation une fois le pilote validé (voir section « Retour sur investissement »).



Ce que ce financement permet concrètement : transformer le back-end de la maquette en plateforme de production sécurisée, intégrer les paiements Mobile Money, déployer et former 50 établissements, et préparer le dossier de conventionnement avec les ministères pour l'extension régionale.

Ce budget couvre


- Finalisation technique de la plateforme (back-end, base de données, paiement)
- Déploiement, formation et support du pilote 50 établissements
- Sécurité, conformité et hébergement souverain
- Structuration juridique, gouvernance et relations institutionnelles

Ce budget ne couvre pas

- Le déploiement national (Phases 2 et 3), financé par la traction du pilote
- La construction de salles de classe ou le financement direct des enseignants
- L'équipement Wi-Fi/fibre à l'échelle nationale (financé par le flux à pleine échelle)

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE

50 000 000 FCFA, poste par poste

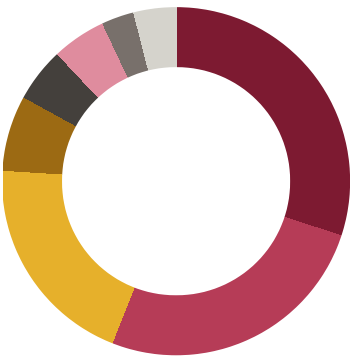

● Développement plateforme	30,0 %	● Ressources humaines	26,0 %
● Déploiement pilote	20,0 %	● Infrastructure cloud	7,0 %
● Sécurité & conformité	5,0 %	● Marketing & institutions	5,0 %
● Juridique & admin.	3,0 %	● Contingence	4,0 %

POSTE DE DÉPENSE	MONTANT (FCFA)	%
Développement plateforme — back-end, API, base de données, paiement Mobile Money, sécurité applicative	15 000 000	30,0 %
Ressources humaines — équipe produit sur 18 mois	13 000 000	26,0 %
Déploiement pilote — 50 établissements (formation, équipement, support terrain)	10 000 000	20,0 %
Infrastructure cloud & hébergement souverain	3 500 000	7,0 %
Sécurité, conformité & protection des données	2 500 000	5,0 %
Marketing, communication & relations institutionnelles	2 500 000	5,0 %
Juridique, administratif & propriété intellectuelle	1 500 000	3,0 %
Contingence (imprévus)	2 000 000	4,0 %
TOTAL	50 000 000	100 %

CHRONOGRAMME

3 phases sur 18 mois

Le budget est engagé progressivement, phase par phase, chaque étape conditionnant le déblocage de la suivante.

1

Fondations & MVP production
MOIS 1 – 6
20 M FCFA (40 %)

- Back-end, API, base de données sécurisée
- Intégration Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo)
- Architecture cloud souveraine & sécurité
- Constitution de l'équipe technique

2

Déploiement pilote
MOIS 7 – 12
18 M FCFA (36 %)

- Onboarding de 50 établissements (Yaoundé/Douala)
- Formation direction, enseignants, parents
- Support terrain & ajustements produit
- Première collecte de cotisations

3


Industrialisation & extension
MOIS 13 – 18
12 M FCFA (24 %)

- Stabilisation & montée en charge
- Conventionnement avec MINEDUB/MINESEC/MINESUP
- Dossier d'extension aux 10 régions
- Rapport d'impact & bilan du pilote

PHASE	DURÉE	BUDGET	JALON DE SORTIE
1 — Fondations & MVP production	6 mois	20 000 000 FCFA	Plateforme v1.0 opérationnelle
2 — Déploiement pilote	6 mois	18 000 000 FCFA	50 établissements actifs
3 — Industrialisation & extension	6 mois	12 000 000 FCFA	Convention-cadre & dossier national
TOTAL	18 mois	50 000 000 FCFA	—

Un rythme de dépense décroissant et maîtrisé

Répartition indicative du budget par trimestre : les dépenses sont plus élevées en début de programme (construction de la plateforme) et diminuent à mesure que le pilote se stabilise.

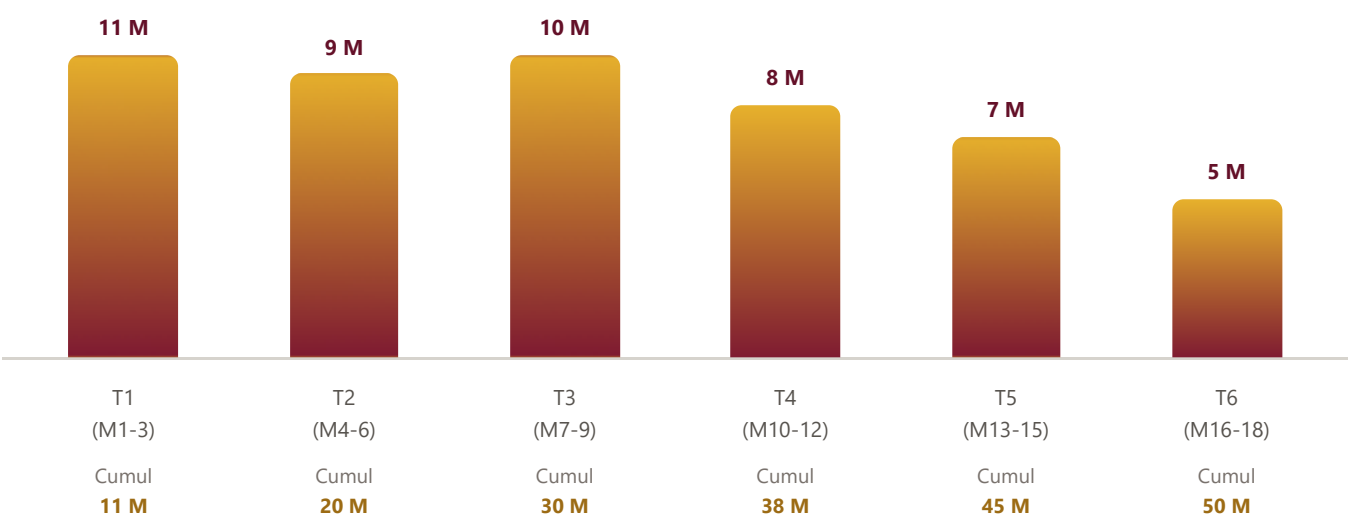

TRIMESTRE	PÉRIODE	DÉCAISSEMENT	CUMUL
T1	Mois 1 – 3	11 000 000 FCFA	11 000 000 FCFA
T2	Mois 4 – 6	9 000 000 FCFA	20 000 000 FCFA
T3	Mois 7 – 9	10 000 000 FCFA	30 000 000 FCFA
T4	Mois 10 – 12	8 000 000 FCFA	38 000 000 FCFA
T5	Mois 13 – 15	7 000 000 FCFA	45 000 000 FCFA
T6	Mois 16 – 18	5 000 000 FCFA	50 000 000 FCFA
TOTAL	18 mois	50 000 000 FCFA	—

De 50 M FCFA investis à 600 M FCFA de revenu récurrent annuel

Kamili EduCampus perçoit une commission de gestion sur les flux de micro-cotisation qu'elle traite (hypothèse de modélisation : 5 %, à négocier avec l'État). Cette commission croît mécaniquement avec chaque établissement onboardé, indépendamment de l'investissement initial.

PHASE	ÉLÈVES COUVERTS	FLUX ANNUEL COLLECTÉ	REVENU PLATEFORME (5 %)
Pilote (financé par ce budget)	60 000	120 000 000 FCFA	6 000 000 FCFA
Régionale (10 régions)	1 000 000	2 000 000 000 FCFA	100 000 000 FCFA
Nationale (saturation)	6 000 000	12 000 000 000 FCFA	600 000 000 FCFA

Effet de levier : 50 M FCFA d'amorçage ouvrent la voie à un potentiel de revenu récurrent de l'ordre de 600 M FCFA/an à pleine échelle nationale — soit un multiple de 12x sur l'investissement initial, en plus de l'impact social direct sur 6 millions d'élèves.

Chiffres indicatifs de modélisation fondés sur une hypothèse de commission de 5 % sur les flux traités ; le taux définitif sera fixé par convention avec les ministères de tutelle. Ils n'engagent pas ATRIC SARL au-delà de leur valeur illustrative. Voir le dossier d'investissement complet « Kamili EduCampus — Déploiement National & Impact Macro-Économique » pour le détail du modèle économique et du plan de déploiement.
